



- 3 Formato Informe Financiero I -
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 3°

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO .

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos financieros	Total
33,165,680.00	33,165,680.00		66,331,360.00

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X		X	

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
					Federal	Estatal		TOTAL	Monto reportado en 2013 Trimestres							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre				4o. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1 Atender la demanda del PE de médico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas diédricas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas diédricas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	17,551,895.83	4,285,921.94	10,467,456.92	6,737,758.69	0.00	21,491,137.55	39,043,033.38	888,326.62	97.78
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	17,907,844.66	0.00	0.00	326,475.34	0.00	326,475.34	18,234,320.00	6,765,680.00	72.94
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : \$8,165,680.00																
GRAN TOTAL					33,165,680.00	33,165,680.00	66,331,360.00	35,459,740.49	4,285,921.94	10,467,456.92	7,064,234.03	0.00	21,817,612.89	57,277,353.38	9,054,006.62	86.35
													Recurso no recibido	8,165,680.00		
													Saldo real	888,326.62		

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan **pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00**


El punto no, 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.


Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un avance del 95%, y a la fecha ya se ha migrado la matrícula a las nuevas instalaciones.





Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción con un avance del 95% en la obra civil y en proceso de equipamiento, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011.



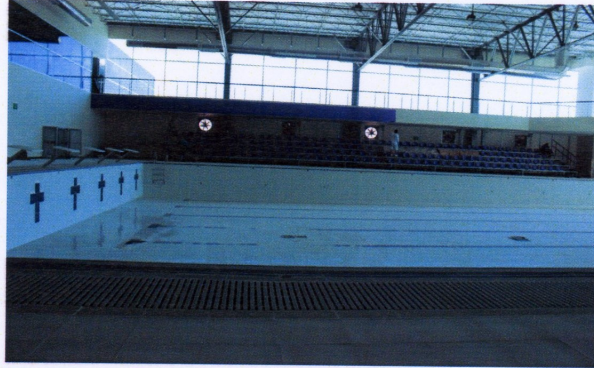


 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ
 RECTOR

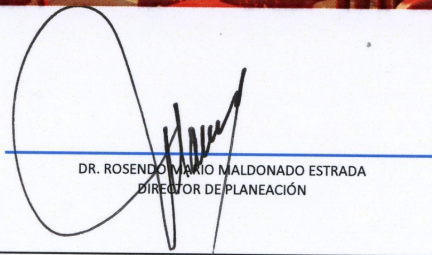
 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 DR. HORACIO JURADO MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA:
 La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.
 ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

- 3 Formato Informe Financiero I -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

15/07/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.


Ejercicio Fiscal Reportado	2011
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Trimestre	2°
-----------	----

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	4,719,045.40	4,719,045.40	No Aplica	35,212,314.60
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 1 y 2	1	545,435.07	545,435.07	No Aplica	34,666,879.53
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 3		1,467,450.12	1,467,450.12	No Aplica	33,199,429.41
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 4		947,372.73	947,372.73	No Aplica	32,252,056.68
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 5		108,174.08	108,174.08	No Aplica	32,143,882.60
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 6		317,040.92	317,040.92	No Aplica	31,826,841.68
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 7		443,352.23	443,352.23	No Aplica	31,383,489.45
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 8		244,866.81	244,866.81	No Aplica	31,138,622.64
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 9		400,677.82	400,677.82	No Aplica	30,737,944.82
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 10		167,476.78	167,476.78	No Aplica	30,570,468.04
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 11		229,887.33	229,887.33	No Aplica	30,340,580.71
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 12		1,281,360.12	1,281,360.12	No Aplica	29,059,220.59
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 13		220,220.75	220,220.75	No Aplica	28,838,999.84
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 14		217,043.73	217,043.73	No Aplica	28,621,956.11
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 15		674,134.34	674,134.34	No Aplica	27,947,821.77
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 16		341,360.59	341,360.59	No Aplica	27,606,461.18
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 17		230,423.17	230,423.17	No Aplica	27,376,038.01
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 18		170,700.73	170,700.73	No Aplica	27,205,337.28
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 19		2,792,577.28	2,792,577.28	No Aplica	24,412,760.00
	Factura	CMA-980529-MW0	288		Estimación 20 y Finiquito		1,170,332.88	1,170,332.88	No Aplica	23,242,427.12
2.1.1	Factura	ACO-900804-354	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas	1	6,972,752.78	6,972,752.78	No Aplica	16,269,674.34
2.1.2	Factura	ACO-900804-354	63	Construcción	Estimación 1	1	290,881.65	290,881.65	No Aplica	15,978,792.69
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 2		354,687.35	354,687.35	No Aplica	15,624,105.34


	Factura	ACO-900804-354			Estimación 3		411,398.47	411,398.47	No Aplica	15,212,706.87	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 4		653,782.32	653,782.32	No Aplica	14,558,924.55	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 5		1,189,089.94	1,189,089.94	No Aplica	13,369,834.61	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 6		372,462.24	372,462.24	No Aplica	12,997,372.37	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 7		720,623.61	720,623.61	No Aplica	12,276,748.76	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 8		374,830.17	374,830.17	No Aplica	11,901,918.59	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 9		672,520.91	672,520.91	No Aplica	11,229,397.68	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 10		1,301,035.17	1,301,035.17	No Aplica	9,928,362.51	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 11		2,077,026.43	2,077,026.43	No Aplica	7,851,336.08	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 12		1,395,583.65	1,395,583.65	No Aplica	6,455,752.43	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 13		1,580,846.06	1,580,846.06	No Aplica	4,874,906.37	
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 14		1,313,721.27	1,313,721.27	No Aplica	3,561,185.10	
	Factura	ACO-900804-354	95		Estimación 15		2,672,858.48	2,672,858.48	No Aplica	888,326.62	
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	1AB3A8A1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	14,819,130.78	14,819,130.78	No Aplica	10,180,869.22	
	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	686,239.73	686,239.73	No Aplica	9,494,629.49	
	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	1,433,308.91	1,433,308.91	No Aplica	8,061,320.58	
	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C10	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	969,165.24	969,165.24	No Aplica	7,092,155.34	
	Factura	UEM-030404-J72	427CCE9C-29FE-4DC8-B0FD-ACF415B5D886	Construcción	Estimación 14 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	326,475.34	326,475.34	No Aplica	6,765,680.00	
					Recurso no recibido		6,765,680.00	6,765,680.00	No Aplica	0.00	
GRAN TOTAL								65,443,033.38	65,443,033.38		13,369,834.61



M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SAENZ
RECTOR



DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



DR. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
