



- 3 Formato Informe Financiero I -  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/03/2014  
 DC/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado 2011

Trimestre 4º

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

| Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento) |                    |   |               |
|---|--------------------|---|---------------|
| Aportación Federal                                      | Aportación Estatal | Otra <sup>N</sup> Productos Financieros | Total         |
| 33,165,680.00   | 33,165,680.00      |   | 66,331,360.00 |

| Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto |    |         |    |
|--|----|---------|----|
| Federal  |    | Estatal |    |
| Si   | No | Si      | No |
| X  |    | X       |    |

| No.   | Objetivo Particular   | Meta  | No. Acción | Acción  | Monto asignado       |                      | Monto Ejercido       |                                    |                                    |                      |                     | TOTAL EJERCIDO    | MONTO POR EJERCER    | % de Avance del monto asignado |                        |                         |
|---|---|---|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|   |   |   |            |   | Federal              | Estatal              | TOTAL                | Monto reportado en años anteriores | Monto reportado en 2013 Trimestres |                      |                     |                   |                      |                                | Total ejercido en 2013 |                         |
|   |   |   |            |   |                      |                      |                      |                                    | 1o. 15 de abril                    | 2o. 15 de julio      | 3o. 15 de octubre   |                   |                      |                                |                        | 4o. 15 de enero de 2014 |
| 1   | Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua   | 1.1 Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.  | 1.1.1      | Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero                  | 700,000.00           | 700,000.00           | 1,400,000.00         | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00                 | 1,400,000.00                   | 0.00                   |                         |
| 2   | Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.  | 2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.   | 2.1.1      | Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina | 19,965,680.00        | 19,965,680.00        | 39,931,360.00        | 17,551,895.83                      | 4,285,921.94                       | 10,467,456.92        | 6,737,758.69        | 888,408.75        | 22,379,546.30        | 39,931,442.13                  | -82.13                 | 100.00                  |
| 3   | Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos. | 3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM | 3.1.1      | Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.   | 12,500,000.00        | 12,500,000.00        | 25,000,000.00        | 17,907,844.66                      | 0.00                               | 0.00                 | 326,475.34          | 0.00              | 326,475.34           | 18,234,320.00                  | 6,765,680.00           | 72.94                   |
| A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : 8'165,680.00 |   |   |            |   |                      |                      |                      |                                    |                                    |                      |                     |                   |                      |                                |                        |                         |
| <b>GRAN TOTAL</b>   |   |   |            |   | <b>33,165,680.00</b> | <b>33,165,680.00</b> | <b>66,331,360.00</b> | <b>35,459,740.49</b>               | <b>4,285,921.94</b>                | <b>10,467,456.92</b> | <b>7,064,234.03</b> | <b>888,408.75</b> | <b>22,706,021.64</b> | <b>58,165,762.13</b>           | <b>8,165,597.87</b>    | <b>87.69</b>            |

Recurso no recibido 8,165,680.00  
 Diferencia cubierta con productos financieros: 82.13

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan **pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00**

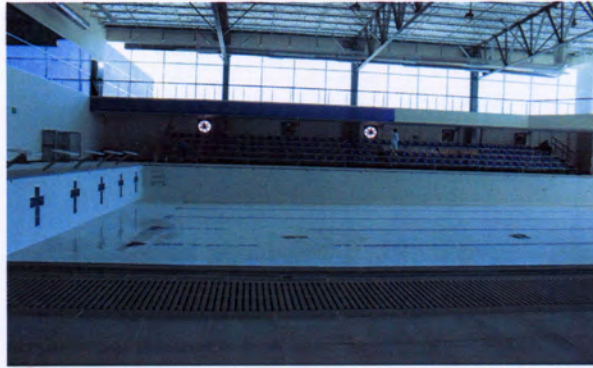
El punto no. 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.


Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos se encuentran terminados al 100%, y en funcionamiento, ya que a la fecha se ha migrado la matrícula a las nuevas instalaciones.





Con respecto a la habitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra terminada al 100% en la obra civil y en proceso de equipamiento, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, y para el equipamiento también es apoyada por el Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, FADOEES 2013.





  
 M.C. JESÚS ENRIQUE SAENZ SAENZ  
 RECTOR

  
 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
 DR. HORACIO JURADO MEDINA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTA:**  
 La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

- 3 Formato Informe Financiero I -  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

15/01/2014  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.


Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.


|                            |      |
|----------------------------|------|
| Ejercicio Fiscal Reportado | 2011 |
|----------------------------|------|


|           |    |
|-----------|----|
| Trimestre | 4° |
|-----------|----|

| No. Acción | Documento de Pago         |                |              |                |   | Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos |                |              | Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir |                   |
|------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|---|--|----------------|--------------|--|-------------------|
|            | Tipo de Documento de Pago | R.F.C.         | No. de Folio | Rubro de Gasto | Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago | Cantidad   | Costo Unitario | Costo Total  | Cantidad faltantes por adquirir                      | Monto por ejercer |
| 1.1.1      |                           |                |              |                | Recurso no recibido   | 1  | 1,400,000.00   | 1,400,000.00 |  | 0.00              |
| 2.1.1      | Factura                   | CMA-980529-MW0 | 61           | Construcción   | 30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF              | 1  | 4,719,045.40   | 4,719,045.40 | No Aplica  | 35,212,314.60     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 1 y 2  | 1  | 545,435.07     | 545,435.07   | No Aplica  | 34,666,879.53     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 3  |  | 1,467,450.12   | 1,467,450.12 | No Aplica  | 33,199,429.41     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 4  |  | 947,372.73     | 947,372.73   | No Aplica  | 32,252,056.68     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 5  |  | 108,174.08     | 108,174.08   | No Aplica  | 32,143,882.60     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 6  |  | 317,040.92     | 317,040.92   | No Aplica  | 31,826,841.68     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 7  |  | 443,352.23     | 443,352.23   | No Aplica  | 31,383,489.45     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 8  |  | 244,866.81     | 244,866.81   | No Aplica  | 31,138,622.64     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 9  |  | 400,677.82     | 400,677.82   | No Aplica  | 30,737,944.82     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 10   |  | 167,476.78     | 167,476.78   | No Aplica  | 30,570,468.04     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 11   |  | 229,887.33     | 229,887.33   | No Aplica  | 30,340,580.71     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 12   |  | 1,281,360.12   | 1,281,360.12 | No Aplica  | 29,059,220.59     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 13   |  | 220,220.75     | 220,220.75   | No Aplica  | 28,838,999.84     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 14   |  | 217,043.73     | 217,043.73   | No Aplica  | 28,621,956.11     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 15   |  | 674,134.34     | 674,134.34   | No Aplica  | 27,947,821.77     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 16   |  | 341,360.59     | 341,360.59   | No Aplica  | 27,606,461.18     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 17   |  | 230,423.17     | 230,423.17   | No Aplica  | 27,376,038.01     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 18   |  | 170,700.73     | 170,700.73   | No Aplica  | 27,205,337.28     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 |              |                | Estimación 19   |  | 2,792,577.28   | 2,792,577.28 | No Aplica  | 24,412,760.00     |
|            | Factura                   | CMA-980529-MW0 | 288          |                | Estimación 20 y Finiquito   |  | 1,170,332.88   | 1,170,332.88 | No Aplica  | 23,242,427.12     |
| 2.1.1      | Factura                   | ACO-900804-3S4 | 62           | Construcción   | 30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas        | 1  | 6,972,752.78   | 6,972,752.78 | No Aplica  | 16,269,674.34     |
| 2.1.2      | Factura                   | ACO-900804-3S4 | 63           | Construcción   | Estimación 1  | 1  | 290,881.65     | 290,881.65   | No Aplica  | 15,978,792.69     |
|            | Factura                   | ACO-900804-3S4 |              |                | Estimación 2  |  | 354,687.35     | 354,687.35   | No Aplica  | 15,624,105.34     |

|                   |         |                |                                       |              |  |   |               |                      |                      |               |                      |
|-------------------|---------|----------------|---------------------------------------|--------------|--|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 3   |   | 411,398.47    | 411,398.47           | No Aplica            | 15,212,706.87 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 4   |   | 653,782.32    | 653,782.32           | No Aplica            | 14,558,924.55 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 5   |   | 1,189,089.94  | 1,189,089.94         | No Aplica            | 13,369,834.61 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 6   |   | 372,462.24    | 372,462.24           | No Aplica            | 12,997,372.37 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 7   |   | 720,623.61    | 720,623.61           | No Aplica            | 12,276,748.76 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 8   |   | 374,830.17    | 374,830.17           | No Aplica            | 11,901,918.59 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 9   |   | 672,520.91    | 672,520.91           | No Aplica            | 11,229,397.68 |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 10  |   | 1,301,035.17  | 1,301,035.17         | No Aplica            | 9,928,362.51  |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 11  |   | 2,077,026.43  | 2,077,026.43         | No Aplica            | 7,851,336.08  |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 12  |   | 1,395,583.65  | 1,395,583.65         | No Aplica            | 6,455,752.43  |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 13  |   | 1,580,846.06  | 1,580,846.06         | No Aplica            | 4,874,906.37  |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 |                                       |              | Estimación 14  |   | 1,313,721.27  | 1,313,721.27         | No Aplica            | 3,561,185.10  |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 | 95                                    |              | Estimación 15  |   | 2,672,858.48  | 2,672,858.48         | No Aplica            | 888,326.62    |                      |
|                   | Factura | ACO-900804-354 | 98                                    |              | Estimación 16 y Finiquito                                      |   | 888,408.75    | 888,408.75           | No Aplica            | -82.13        |                      |
|                   |         |                |                                       |              |  |   |               |                      |                      |               |                      |
|                   |         |                |                                       |              |  |   |               |                      |                      |               |                      |
| 3.1.1             | Factura | UEM-030404-J72 | 1AB3A8A1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5  | Construcción | 30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF | 1 | 14,819,130.78 | 14,819,130.78        | No Aplica            | 10,180,869.22 |                      |
|                   | Factura | UEM-030404-J72 | 3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8  | Construcción | Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF    | 1 | 686,239.73    | 686,239.73           | No Aplica            | 9,494,629.49  |                      |
|                   | Factura | UEM-030404-J72 | 3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9  | Construcción | Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF    | 1 | 1,433,308.91  | 1,433,308.91         | No Aplica            | 8,061,320.58  |                      |
|                   | Factura | UEM-030404-J72 | 3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C10 | Construcción | Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF    | 1 | 969,165.24    | 969,165.24           | No Aplica            | 7,092,155.34  |                      |
|                   | Factura | UEM-030404-J72 | 427CCE9C-29FE-4DC8-B0FD-ACF415B5D886  | Construcción | Estimación 14 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF   | 1 | 326,475.34    | 326,475.34           | No Aplica            | 6,765,680.00  |                      |
|                   |         |                |                                       |              | Recurso no recibido  |   | 6,765,680.00  | 6,765,680.00         | No Aplica            | 0.00          |                      |
|                   |         |                |                                       |              |  |   |               |                      |                      |               |                      |
|                   |         |                |                                       |              |  |   |               |                      |                      |               |                      |
| <b>GRAN TOTAL</b> |         |                |                                       |              |  |   |               | <b>66,331,442.13</b> | <b>66,331,442.13</b> |               | <b>13,369,834.61</b> |

  
M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ  
RECTOR

  
DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
DR. HORACIO JURADO MEDINA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTA:**

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
