



(En Pesos)

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Fecha de actualización: 

15/04/2014
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Ejercicio Fiscal Reportado	2011
----------------------------	------

Trimestre: 

1º
----

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X		X	

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4ª. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra <sup>1/</sup> Fuentes	Total
33,165,680.00	33,165,680.00		66,331,360.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido						TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
					Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013	Monto reportado en 2014							Total ejercido en 2014
										30. 15 de abril	30. 15 de julio	30. 15 de octubre	30. 15 de enero de 2015				
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1 Atender la demanda del PE de médico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	17,551,895.83	22,379,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,931,442.13	-82.13	100.00
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	17,907,844.66	326,475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,234,320.00	6,765,680.00	72.94
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : 8'165,680.00																	
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>33,165,680.00</b>	<b>33,165,680.00</b>	<b>66,331,360.00</b>	<b>35,459,740.49</b>	<b>22,706,021.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,165,762.13</b>	<b>8,165,597.87</b>	<b>87.69</b>
															Recurso no recibido	8,165,680.00	
															Diferencia cubierta con productos financieros:	-	82.13

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00





El punto no. 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.






Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos se encuentran terminados al 100%, y en funcionamiento, ya que a la fecha se ha migrado la matrícula a las nuevas instalaciones.





Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra terminada al 100% en la obra civil y en proceso de equipamiento, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, y para el equipamiento también es apoyada por el Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, FADOEES 2013.

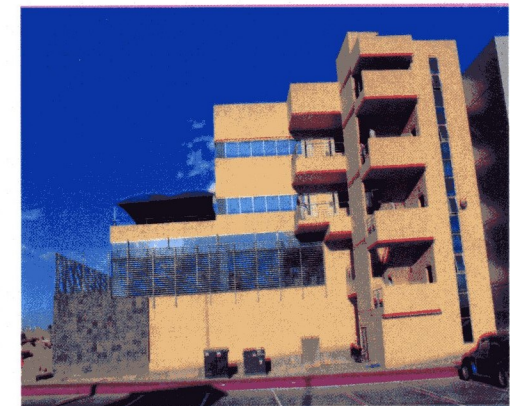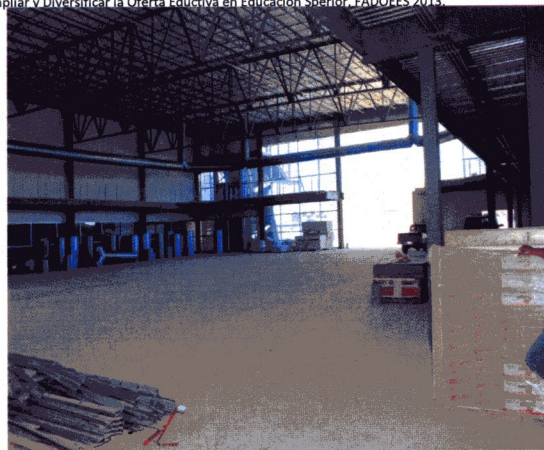




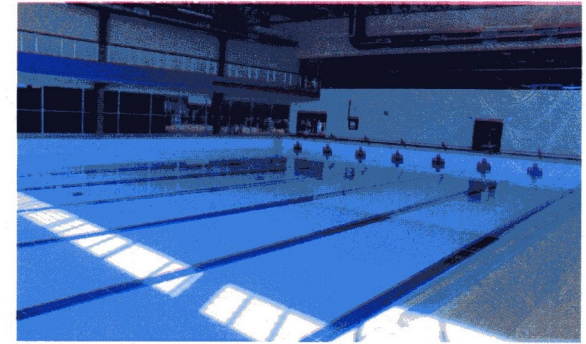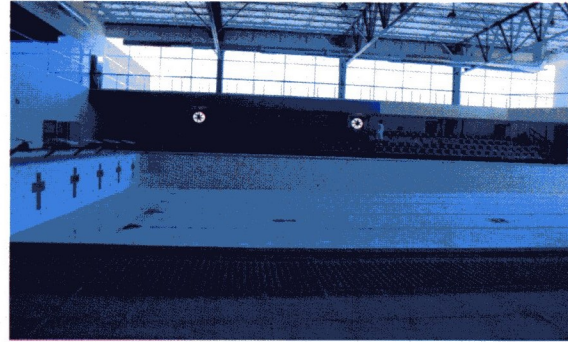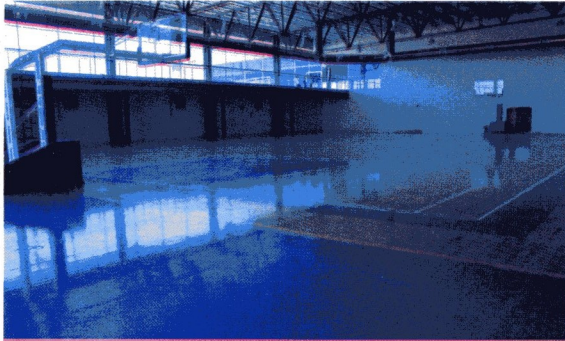

  
 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ  
 RECTOR

  
 DR. ROSENDA MARÍA MALDONADO ESTRADA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

  
 DR. HORACIO MIRANDA MEDINA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 M.F. OMAR ACOSTA SINECIO  
 AUDITOR INTERNO

**NOTA:**  
 La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.





- 3 Formato Informe Financiero I -  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

15/04/2014

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Ejercicio Fiscal Reportado	2011
----------------------------	------

Trimestre	1°
-----------	----

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	4,719,045.40	4,719,045.40	No Aplica	35,212,314.60
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 1 y 2	1	545,435.07	545,435.07	No Aplica	34,666,879.53
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 3		1,467,450.12	1,467,450.12	No Aplica	33,199,429.41
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 4		947,372.73	947,372.73	No Aplica	32,252,056.68
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 5		108,174.08	108,174.08	No Aplica	32,143,882.60
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 6		317,040.92	317,040.92	No Aplica	31,826,841.68
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 7		443,352.23	443,352.23	No Aplica	31,383,489.45
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 8		244,866.81	244,866.81	No Aplica	31,138,622.64
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 9		400,677.82	400,677.82	No Aplica	30,737,944.82
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 10		167,476.78	167,476.78	No Aplica	30,570,468.04
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 11		229,887.33	229,887.33	No Aplica	30,340,580.71
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 12		1,281,360.12	1,281,360.12	No Aplica	29,059,220.59
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 13		220,220.75	220,220.75	No Aplica	28,838,999.84
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 14		217,043.73	217,043.73	No Aplica	28,621,956.11
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 15		674,134.34	674,134.34	No Aplica	27,947,821.77
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 16		341,360.59	341,360.59	No Aplica	27,606,461.18
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 17		230,423.17	230,423.17	No Aplica	27,376,038.01
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 18		170,700.73	170,700.73	No Aplica	27,205,337.28
	Factura	CMA-980529-MW0			Estimación 19		2,792,577.28	2,792,577.28	No Aplica	24,412,760.00
	Factura	CMA-980529-MW0	288		Estimación 20 y Finiquito		1,170,332.88	1,170,332.88	No Aplica	23,242,427.12
2.1.1	Factura	ACO-900804-354	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas	1	6,972,752.78	6,972,752.78	No Aplica	16,269,674.34
2.1.2	Factura	ACO-900804-354	63	Construcción	Estimación 1	1	290,881.65	290,881.65	No Aplica	15,978,792.69
	Factura	ACO-900804-354			Estimación 2		354,687.35	354,687.35	No Aplica	15,624,105.34
