

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2014
DDMM/AAO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 1

Nombre del Proyecto General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda de educación superior, mediante el fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento en las facultades de Cs. Agrotécnicas, Campus Cuauhtémoc, Medicina, y Educación Física y Cs. del Deporte, en diferentes ubicaciones de la Cd. de Chihuahua, que permita atender la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.



Objetivo General:

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
12,687,727.00	16,000,000.00	-	28,687,727.00


No.	Objetivo Particular	Meta	No. Accés	Accés	Monto Federal Asignado	Monto reportado en 2013	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							Monto reportado en 2014				Monto total ejercido en 2014			
							1o. Trimestre	2o. Trimestre	3o. Trimestre	4o. Trimestre				
15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero de 2015											
1	Habilitar los espacios académicos suficientes para diversificar la oferta educativa con nuevos programas de Licenciatura en la Facultad de Medicina y atender con calidad la demanda generada por dichos programas.	Construcción y habilitación de aula de usos múltiples para atender las necesidades académicas de los programas de Médico Cirujano y Partero, Lic. En Salud Pública, Ing. En Biomédica, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, así como 10 Especialidades médicas que se ofrecen en la Fac. de Medicina, Campus 2 Chihuahua	1.1.1	Construcción y Habilidadación de aula de usos múltiples	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
				Mobiliario y equipo para el aula de usos múltiples	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
				Remodelación y habilitación de laboratorio de Terapia Física y rehabilitación	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		
				Mobiliario y equipo para el laboratorio de Terapia Física y rehabilitación.	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00		
2	Habilitar los espacios suficientes para vincular la teoría con la práctica de los alumnos de los PE de Lic. En Motricidad Humana y Lic. en Educación Física, así como los programas de Posgrado de la Fac. de Cs. de la Cultura Física, y dar cabida a la ampliación de la demanda atendida	Equipar el Edificio de Laboratorios de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, construido con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011 y 2012 y que servirá para vincular la teoría con la práctica de los alumnos de la facultad.	2.1.1	Equipamiento y habilitación del Edificio de laboratorios	9,500,000.00	9,243,652.93	256,347.07	0.00	0.00	0.00	256,347.07	9,500,000.00	0.00	100.00
3	Habilitar los espacios suficientes para vincular la teoría con la práctica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrotécnicas, y dar una atención de calidad a la demanda de los nuevos PE de Ing. en Gestión e Innovación Tecnológica, Ing. Hortícola y Doctorado en Cs. Hortícolas, así como a los programas de Lic. en Admón. Tecnológica y Maestría en Cs. de la Productividad Frutícola	Construcción y Habilidadación de un laboratorio Agroindustrial necesario para atender con calidad la demanda de los nuevos programas educativos de la facultad de Cs. Agrotécnicas	3.1.1	Construcción y habilitación de Laboratorio Agroindustrial	2,687,727.00	769,533.69	862,161.29	0.00	0.00	0.00	862,161.29	1,631,694.98	1,056,032.02	60.71
GRAN TOTAL					28,687,727.00		1,118,508.36	0.00	0.00	0.00	11,131,694.98	17,556,032.02	38.80	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Para el ejercicio de los recursos autorizados para este proyecto, podemos comentar que en cuanto a los recursos destinados a la construcción de aulas y laboratorios de la Facultad de Medicina, a la fecha se encuentran en los trámites de licitación. Con respecto al punto No. 2, es una prioridad para la Universidad Autónoma de Chihuahua, habilitar los espacios suficientes para vincular la teoría con la práctica de los alumnos de los PE de Lic. En Motricidad Humana y Lic. en Educación Física, así como los programas de Posgrado de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte, ya que en este ciclo escolar de agosto, se migró el 100% de la matrícula de dicha facultad a las nuevas instalaciones en el Campus 2 de la Cd. de Chihuahua, y así dar cabida a la ampliación de la demanda atendida.

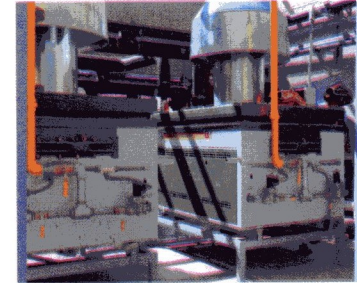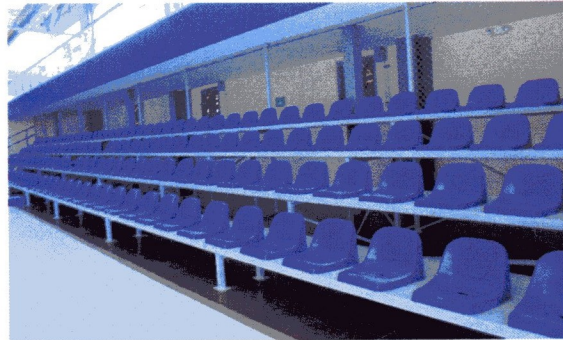


Con respecto al punto No. 3, Construcción y Habilitación de un laboratorio Agroindustrial necesario para atender con calidad la demanda de los nuevos programas educativos de la facultad de Cs. Agrotecnológicas, se ha dado inicio a la construcción de dicho espacio académico, estando a la fecha con un avance de mas del 50% de construcción de la obra negra.


 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ
 RECTOR


 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 DR. HORACIO JURADO MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 M.F. OMAR ALMELA SINECIO
 AUDITOR INTERNO

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA EMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/04/2014
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Trimestre	1°
-----------	----


Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado	2013
----------------------------	------


Nombre del Proyecto General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda de educación superior, mediante el fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento en las facultades de Cs. Agrotecnológicas, Campus Cuauhtémoc, Medicina, y Educación Física y Cs. del Deporte, en diferentes ubicaciones de la Cd. de Chihuahua, que permita atender la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1										6,000,000.00
1.1.2										2,000,000.00
1.2.1										4,000,000.00
1.2.2										4,500,000.00
2.1.1	Factura			Equipo	Equipamiento Laboratorio Fisioterapia	1.00	1,740,000.00	1,740,000.00		7,760,000.00
	Factura	GEO990820190	699bffd0-ec1d-4101-b5f1-1860b106e736	Equipo	Equipamiento Laboratorio Fisioterapia	1.00	426,521.20	426,521.20		7,333,478.80
	Factura	GEO990820190	c162f2a2-eb10-4554-917c-51ccea9ffb7	Equipo	Equipamiento Laboratorio Fisioterapia	1.00	442,001.79	442,001.79		6,891,477.01
	Factura	OIHE70120987A	A1138	Equipo	Equipo laboratorio Acuatico, Anticipo	1.00	463,269.28	463,269.28		6,428,207.73
	Factura	OIHE70120987A	A1139	Equipo	Equipo y Material para Gimnasio Basquet bol, Anticipo	1.00	561,786.84	561,786.84		5,866,420.89
	Factura	IML0512092V6	236	Equipo	Aparatos Área de Gimnasia (Anticipo)	1.00	1,404,709.40	1,404,709.40		4,461,711.49
	Factura	ATR091027F96	A 105	Equipo	Gradas Retráctiles (Anticipo 50%)	1.00	794,999.04	794,999.04		3,666,712.45
	Factura	OIHE70120987A	A1199	Equipo	Equipo laboratorio Acuatico, Finiquito	1.00	463,270.12	463,270.12		3,203,442.33
	Factura	OIHE70120987A	A1198	Equipo	Equipo y Material para Gimnasio Basquet bol, Finiquito	1.00	561,786.84	561,786.84		2,641,655.49
	Factura	MECY810506TZ0	B200	Equipo	Gradas Metálicas	1.00	92,800.00	92,800.00		2,548,855.49
	Factura	GALC850424G37	71 A	Equipo	Butacas para Gradas Metálicas	200.00	464.00	92,800.00		2,456,055.49
	Factura	ATR091027F96	A 119	Equipo	Gradas Retráctiles (Restante 50%)	1.00	794,999.04	794,999.04		1,661,056.45
	Factura	IML0512092V6	253	Equipo	Aparatos Área de Gimnasia (Restante)	1.00	1,404,709.38	1,404,709.38		256,347.07
	Factura	SFI991123AZA	1551997	Equipo	Bicicletas Spinning	1.00	256,347.07	256,347.07		0.00


								0.00		0.00
3.1.1	Factura	COS120125CA2	52	Obra	30% Anticipo contrato CCMS-004-2013-IF Lab. Agroindustrial FACIATEC	1.00	769,533.69	769,533.69		1,918,193.31
	Factura	COS120125CA2	1	Obra	Estimación No. 1	1.00	1,329.41	1,329.41		1,916,863.90
	Factura	COS120125CA2	2	Obra	Estimación No. 2	1.00	249,849.13	249,849.13		1,667,014.77
	Factura	COS120125CA2	12	Obra	Estimación No. 3	1.00	142,055.35	142,055.35		1,524,959.42
	Factura	COS120125CA2	19	Obra	Estimación No. 4	1.00	468,927.40	468,927.40		1,056,032.02
GRAN TOTAL								11,131,694.98		17,556,032.02



M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ
RECTOR



DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



DR. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.F. OMAR ALMELÁ SINECIO
AUDITOR INTERNO

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).
