



- 3 Formato Informe Financiero I -
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2013
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 1°

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^M Fuentes Financieras	Total
33,165,680.00	33,165,680.00		66,331,360.00

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X		X	

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado		Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
					Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							
									30. 15 de abril	30. 15 de julio	30. 15 de octubre				30. 15 de enero de 2014	
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1 Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	17,660,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660,546.68	22,270,813.32	44.23
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	17,904,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904,040.83	7,095,959.17	71.62
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : \$165,680.00																
GRAN TOTAL					33,165,680.00	33,165,680.00	66,331,360.00	35,564,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,564,587.51	30,766,772.49	53.62

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan **pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00**


El punto no, 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.

Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un considerable avance, tomando en cuenta que la construcción se inicio fuera del tiempo programado



Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción, cabe aclarar que esta obra tambien es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, por lo que el presente recurso solamente cubrirá una primera parte de la obra total.




DR. HORACIO JUANDO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁNEZ SÁENZ
RECTOR




DR. ROSENDO MARÍA MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

- 3 Formato Informe Financiero I -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

15/04/2013

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.


Ejercicio Fiscal Reportado	2012
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Trimestre	1
-----------	---


No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	4,719,045.40	4,719,045.40	No Aplica	35,212,314.60
					Estimación 1 y 2	1	545,911.84	545,911.84	No Aplica	34,666,402.76
					Estimación 3		1,467,450.12	1,467,450.12	No Aplica	33,198,952.64
					Estimación 4		947,372.73	947,372.73	No Aplica	32,251,579.91
					Estimación 5		108,174.08	108,174.08	No Aplica	32,143,405.83
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas	1	6,972,752.78	6,972,752.78	No Aplica	25,170,653.05
2.1.2	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	63	Construcción	Estimación 1	1	290,881.65	290,881.65	No Aplica	24,879,771.40
					Estimación 2		354,687.35	354,687.35	No Aplica	24,525,084.05
					Estimación 3		411,398.47	411,398.47	No Aplica	24,113,685.58
					Estimación 4		653,782.32	653,782.32	No Aplica	23,459,903.26
					Estimación 5		1,189,089.94	1,189,089.94	No Aplica	22,270,813.32
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	1AB3A8A1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	14,819,130.78	14,819,130.78	No Aplica	10,180,869.22
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	686,239.73	686,239.73	No Aplica	9,494,629.49
3.1.2	Factura	UEM-030404-J73	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	1,430,698.63	1,430,698.63	No Aplica	8,063,930.86

3.1.3	Factura	UEM-030404-J74	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C10	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	967,971.69	967,971.69	No Aplica	7,095,959.17	
					Recurso no recibido		6,765,680.00	6,765,680.00	No Aplica	330,279.17	
GRAN TOTAL								43,730,267.51	43,730,267.51		22,601,092.49


 DR. HORACIO JURADO MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SAENZ
 RECTOR




 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NOTA:
 La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



- 3 Formato Informe Financiero I -
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2013
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 1°

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^M Fuentes Financieras	Total
33,165,680.00	33,165,680.00		66,331,360.00

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
X		X	

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
					Federal	Estatal		TOTAL	Monto reportado en 2013							
									Trimestres							
								30. 15 de abril	30. 15 de julio	30. 15 de octubre	30. 15 de enero de 2014	Total ejercido en 2013				
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1 Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	17,660,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660,546.68	22,270,813.32	44.23
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	17,904,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904,040.83	7,095,959.17	71.62
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : \$165,680.00																
GRAN TOTAL					33,165,680.00	33,165,680.00	66,331,360.00	35,564,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,564,587.51	30,766,772.49	53.62

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS


El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan **pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00**

El punto no, 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.

Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un considerable avance, tomando en cuenta que la construcción se inicio fuera del tiempo programado



Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción, cabe aclarar que esta obra tambien es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, por lo que el presente recurso solamente cubrirá una primera parte de la obra total.



DR. HORACIO JUANDO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁNEZ SÁENZ
RECTOR



DR. ROSENDO MARÍA MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

- 3 Formato Informe Financiero I -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

15/04/2013

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.


Ejercicio Fiscal Reportado	2012
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DEL INCREMENTO A LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE TSU/PA, LIC Y POSGRADO, ASI COMO EL IMPULSO DEL CAMPUS VIRTUAL.

Trimestre	1
-----------	---


No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	4,719,045.40	4,719,045.40	No Aplica	35,212,314.60
					Estimación 1 y 2	1	545,911.84	545,911.84	No Aplica	34,666,402.76
					Estimación 3		1,467,450.12	1,467,450.12	No Aplica	33,198,952.64
					Estimación 4		947,372.73	947,372.73	No Aplica	32,251,579.91
					Estimación 5		108,174.08	108,174.08	No Aplica	32,143,405.83
2.1.1	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas	1	6,972,752.78	6,972,752.78	No Aplica	25,170,653.05
2.1.2	Factura	CMA-980529-MW0 Aulas	63	Construcción	Estimación 1	1	290,881.65	290,881.65	No Aplica	24,879,771.40
					Estimación 2		354,687.35	354,687.35	No Aplica	24,525,084.05
					Estimación 3		411,398.47	411,398.47	No Aplica	24,113,685.58
					Estimación 4		653,782.32	653,782.32	No Aplica	23,459,903.26
					Estimación 5		1,189,089.94	1,189,089.94	No Aplica	22,270,813.32
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	1AB3A8A1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	14,819,130.78	14,819,130.78	No Aplica	10,180,869.22
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	686,239.73	686,239.73	No Aplica	9,494,629.49
3.1.2	Factura	UEM-030404-J73	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	1,430,698.63	1,430,698.63	No Aplica	8,063,930.86

3.1.3	Factura	UEM-030404-J74	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C10	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	967,971.69	967,971.69	No Aplica	7,095,959.17	
					Recurso no recibido		6,765,680.00	6,765,680.00	No Aplica	330,279.17	
GRAN TOTAL								43,730,267.51	43,730,267.51		22,601,092.49


 DR. HORACIO JURADO MEDINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SAENZ
 RECTOR




 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NOTA:
 La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR


**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2011
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

(MILES DE PESOS)

FECHA

15/04/2013

DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
NOMBRE DEL FONDO:	EJERCICIO	2011
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO .
OBJETIVO GENERAL: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

PROYECTOS PARTICULARES					TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011				2012	Recursos No Recibidos	MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4er. Trimestre 15 de enero del 2012			
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	0%	1,400,000.00	-	-	-	-	1,400,000.00	0.00	
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	55%	39,931,360.00	-	-	-	21,836,716.51		18,094,643.49	
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua: gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM.	72%	25,000,000.00	-	-	-	17,907,844.67	6,765,680.00	326,475.33	
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de : 8'165,680.00										0.00	
TOTAL				66,331,360.00	0.00	0.00	0.00	39,744,561.18	8,165,680.00	18,421,118.82	
				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.92%		27.77%	

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS


El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no solo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales.

Para cumplir el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el " Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas . . . mediante programas universitarios de alta calidad, . . . que mantiene su compromiso original de coadyuvar al desarrollo social y económico de la entidad, . . . y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura"; es necesario contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesite, incrementado la cobertura con programas factibles y pertinentes.

El presente proyecto presentó un desfase en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se adjudicaron las obras y ya se iniciaron las construcciones, llevando a la fecha un importante avance en el ejercicio de los recursos recibidos, ya que aun no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00


El punto no, 1 no se ha podido iniciar ya que no contamos con el respaldo financiero para su construcción, derivado del faltante de ministrar por parte de la federación.

Con respecto a la construcción del edificio de aulas y edificio de laboratorios para la facultad de medicina del Campus Parral, punto no. 2, estos presentan un considerable avance, tomando en cuenta que la construcción se inicio fuera del tiempo programado

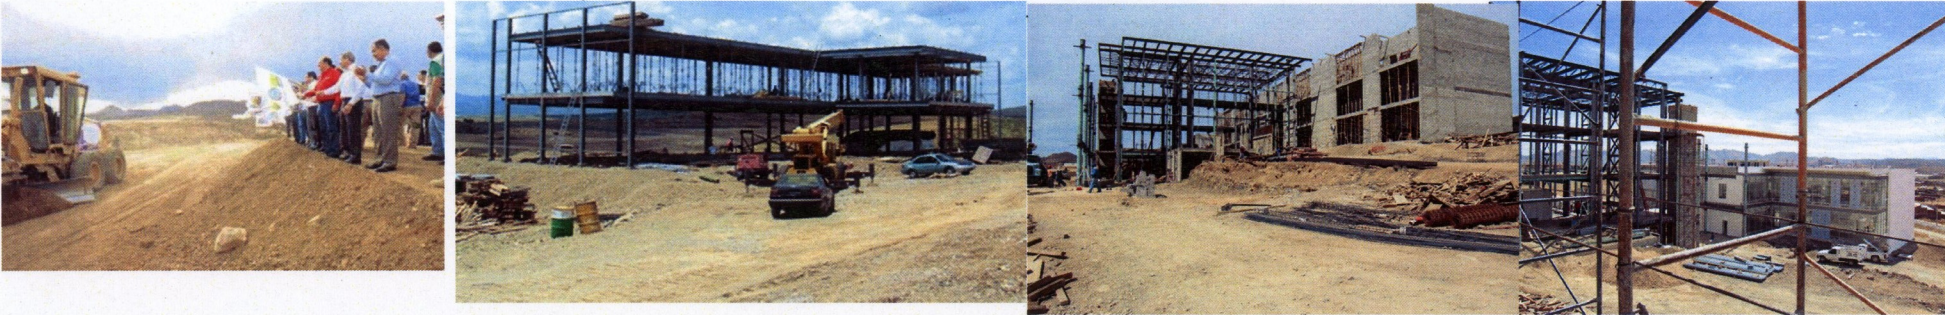



Con respecto a la habilitación y equipamiento del Edificio "D" para la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua, esta obra se encuentra en proceso de construcción, cabe aclarar que esta obra también es apoyada con el Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, por lo que el presente recurso solamente cubrirá una primera parte de la obra total.




M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SAENZ
RECTOR


DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR PLANEACIÓN


C.Dr.A.P. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.F. OMAR ALVARADO SINECIO
AUDITOR INTERNO

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(Ejercicio Fiscal 2011 y 2012)

Fecha de actualización: 15/04/2013
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado 2011

Trimestre 4*

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO.

Objetivo General: Incrementar la Cobertura y la Atención a la demanda por medio de la Construcción y habilitación del Nuevo Campus Universitario en la Ciudad del Parral, Chihuahua, para atender la demanda de educación superior con PE pertinentes a la realidad económica del sur del Estado de Chihuahua; y por medio de la Construcción de la 4a. etapa del proyecto de migración de la Unidad Académica de Educación Física y Cs. del Deporte al Campus Universitario 2 en la Cd. de Chihuahua.

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	Recurso no recibido	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2012								
									Trimestres	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2013				
1	Construcción y habilitación del Anfiteatro y laboratorio de disección equipado con cap. de 20 alumnos para la facultad de Medicina ubicada en el nuevo campus situado en la ciudad de Parral, Chihuahua	1.1 Atender la demanda del PE de medico Cirujano Partero en la Ciudad de Parral Chihuahua.	1.1.1	Construcción y habilitación del anfiteatro para la operación del PE de médico cirujano partero	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0%
2	Construcción de un edificio de tres niveles con 18 Aulas equipadas, con capacidad para 40 personas cada una, y Edificio de dos niveles con 8 laboratorios.	2.1 Habilitar los espacios académicos por medio de la construcción de las aulas didácticas del Nuevo campus Universitario en la Ciudad de Parral Chihuahua.	2.1.1	Construcción y habilitación de las aulas didácticas para la operación del PE de la Unidad Académica de Medicina	19,965,680.00	19,965,680.00	39,931,360.00	0.00	4,719,045.40	7,809,546.27	9,308,124.84	21,836,716.51	21,836,716.51	18,094,643.49	55%		
3	Habilitación y equipamiento del Edificio "D" de dos niveles para la facultad de educación física y ciencias del deporte ubicada en el Campus 2 de la Ciudad de Chihuahua; gimnasio, zona de aparatos, acceso y recepción, sanitarios, bodega, vestidores y regaderas, alberca semiolímpica, cardiovascular y diversos anexos.	3.1 Habilitar y construir diversos espacios académicos complementarios de la facultad de educación física y ciencias del deporte. Esta obra se complementa con los recursos autorizados por medio del FAM	3.1.1	Fortalecer y acondicionar los espacios del edificio "D" de la Facultad de Educación Física y Cs. Del Deporte.	12,500,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	0.00	15,505,370.51	2,402,474.16	0.00	17,907,844.67	17,907,844.67	6,765,680.00	326,475.33	99%	
A la fecha estamos en la espera de la liberación de recursos federales por un monto total de: \$ 105,680.00																	
GRAN TOTAL					33,165,680.00	33,165,680.00	66,331,360.00	0.00	0.00	20,224,415.91	10,212,020.43	9,308,124.84	39,744,561.18	39,744,561.18	8,165,680.00	26,586,798.82	60%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El ofrecer una educación de calidad que privilegie la equidad, requiere tomar en cuenta no solo el acceso a las instituciones de educación superior, sino incrementar la permanencia y garantizar el éxito en la educación, igualando las oportunidades educativas compensando las desigualdades sociales que presentan las poblaciones vulnerables por razones económicas, sociales, de género, geográficas, étnicas y culturales.
Para cumplir el objetivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, implícito en su MISIÓN, que entre otras cosas contempla el " Formar ciudadanos de manera integral, con valores universales y capaces de dar respuestas pertinentes y creativas . . . mediante programas universitarios de alta calidad, . . . que mantiene su compromiso original de coadyuvar al desarrollo social y económico de la entidad, . . . y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura"; es necesario contar con infraestructura adecuada y suficiente para atender la creciente demanda de educación superior, la cual implica llevar la educación a los lugares a donde se necesite, incrementado la cobertura con programas factibles y pertinentes.
El presente proyecto está desfazado en su ejecución debido a la necesidad de contar con respaldo financiero para poder iniciar con los tramites de licitación; A la fecha se lleva un considerable avance en los trabajos de construcción, aun y cuando no contamos con la liberación total de los recursos federales asignados para este proyecto, ya que a la fecha quedan pendientes de recibir un monto total de \$8,165,680.00, cabe mencionar que la contraparte estatal ha sido recibida al 100%.

C.Dr. A.P. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ROSARIO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. JESUS ENRIQUE SÁENZ SÁENZ
RECTOR

NOTA: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REVISADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMÁNDOLE AL RECTOR (A), CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU).

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

Fecha de actualización:	15/04/2013 DD/MM/AÑO
-------------------------	-------------------------

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado: 2011

Trimestre: 4°

Nombre del Proyecto General: AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO POR MEDIO DE LA APERTURA DEL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE PARRAL, ASI COMO INCREMENTAR LA MATRICULA CON P.E. DE CALIDAD Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON NUEVOS P.E. DE LIC Y POSGRADO .

No. Acción	Tipo de Documento de	R.F.C.	Documento de Pago		Descripción de Bienes o Servicios en Documento de Pago	Bienes o Servicios a Adquirir			Bienes o Servicios Adquiridos			Bienes o Servicios por Adquirir		
			No. de Folio	Rubro de Gasto		Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad artículo	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por	Monto faltante por comprobar	
1.1.1					Recurso no recibido	1	1,400,000.00	1,400,000.00						1,400,000.00
											1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
2.1.1	Factura	CMA-980529-MWO	61	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-004-2012-PF	1	39,931,360.00	39,931,360.00	no aplica	4,719,045.40	4,719,045.40	no aplica		35,212,314.60
					Estimación 1 y 2	1			no aplica	545,911.84	545,911.84	no aplica		34,666,402.76
					Estimación 3					1,467,450.12	1,467,450.12	no aplica		33,198,952.64
					Estimación 4					947,372.73	947,372.73	no aplica		32,251,579.91
					Estimación 5					108,174.08	108,174.08	no aplica		32,143,405.83
					Estimación 6					317,040.92	317,040.92	no aplica		31,826,364.91
					Estimación 7					443,352.23	443,352.23	no aplica		31,383,012.68
					Estimación 8					244,866.81	244,866.81	no aplica		31,138,145.87
					Estimación 9					400,677.82	400,677.82	no aplica		30,737,468.05
					Estimación 10					167,476.78	167,476.78	no aplica		30,569,991.27
					Estimación 11					229,887.33	229,887.33	no aplica		30,340,103.94
					Estimación 12					1,279,782.09	1,279,782.09	no aplica		29,060,321.85
2.1.1	Factura	CMA-980529-MWO Aulas	62	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-005-2012-PF Aulas	1			no aplica	6,972,752.78	6,972,752.78	no aplica		22,087,569.07
2.1.2	Factura	CMA-980529-MWO Aulas	63	Construcción	Estimación 1	1			no aplica	290,881.65	290,881.65	no aplica		21,796,687.42
					Estimación 2					354,687.35	354,687.35	no aplica		21,442,000.07
					Estimación 3					411,398.47	411,398.47	no aplica		21,030,601.60
					Estimación 4					653,782.32	653,782.32	no aplica		20,376,819.28
					Estimación 5					1,189,089.94	1,189,089.94	no aplica		19,187,729.34
					Estimación 6					372,462.24	372,462.24	no aplica		18,815,267.10
					Estimación 7					720,623.61	720,623.61	no aplica		18,094,643.49
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	1AB3A8A1-8EAB-47E6-BEDF-CBCFE74A12C5	Construcción	30% de anticipo del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1	25,000,000.00	25,000,000.00	no aplica	14,819,130.78	14,819,130.78	no aplica		10,180,869.22
3.1.1	Factura	UEM-030404-J72	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C8	Construcción	Estimación 1 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	686,239.73	686,239.73	no aplica		9,494,629.49
3.1.2	Factura	UEM-030404-J73	3D957058-706C-41BF-918C-BB1AD58D04C9	Construcción	Estimación 2 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	1,433,308.91	1,433,308.91	no aplica		8,061,320.58
3.1.3	Factura	UEM-030404-J74	3D957058-706C-41BF-918C-	Construcción	Estimación 3 del contrato de obra No. UACH-CCMS-003-2012-PF	1			no aplica	969,165.24	969,165.24	no aplica		7,092,155.34
					Recurso no recibido						6,765,680.00	6,765,680.00		326,475.34

TOTAL


66,331,360.00

66,331,360.00


47,910,241.17

47,910,241.17


19,514,204.68



C. Dr. A. P. HORACIO JURADO MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



M. C. JESUS ENRIQUE SAENZ SAENZ
RECTOR

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto ajustado presentado a la SEP y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
